



La mémoire maritime en action
La Petite Plaisance

eammlr.com

P.P.L. info

Bulletin d'information sur les activités des chantiers en cours destiné aux passionnés des Mercredi de la P.P.L

Édition du Mercredi 26 JUIN 2019

N° 80

AVANCEMENT DES PREPARATIONS BATEAUX INSCRITS POUR LE TROPHEE 24 & 25 AOUT 2019

N°	TYPE DE BATEAU	NOM DU BATEAU	AVANCE 25%	AVANCE 50%	AVANCE 75%	PRÊT 100%	ESSAIS EN MER
1	SNIFE PPL	LA PETITE PLAISANCE					
2	VAURIEN 1	FREDERICK 2					
3	VAURIEN 2	OLE MOLE					
4	FLIBUSTIER	TAICUA					
5	CANETON BRIKX	PATOUCHE					
6	CANETON AUBIN	LA P'TITE FOLIE					
7	CANETON 57	SIGRID					
8	SNIFE	DOLCE VITA					
9	SHARPIE	WILL YOU STILL BE MINE					
10	FINN NOIR						
11							
12							
13							

Les différents chantiers en cours avancent bien, Par contre en comparaison avec le planning fait par Dominique lors du dernier anniversaire sur les 10 bateaux au planning;

3 sont à 75%.

3 sont à 50%

4 n'ont pas avancé

Il est donc Important de concentrer nos efforts Sur les bateaux listés pour le trophée. Sinon compte tenu des forces vives disponibles en période juillet Aout ; nos bateaux ne seront pas prêts au bon moment.

m.a.j 29,06,2019



La mémoire maritime en action

La Petite Plaisance

ammlr.com

P.P.L. info

Chantier Moth Fragnière

François et Christian s'affairent sur les finitions du caillebotis de fond ainsi que la fixation du couvre quille sous contrôle qualité de Jean.



Positionnement du couvre quille


Verrouillage du couvre quille en pied de puit de dérive



Détail de fixation arrière du couvre quille



Détail de fixation avant du couvre quille

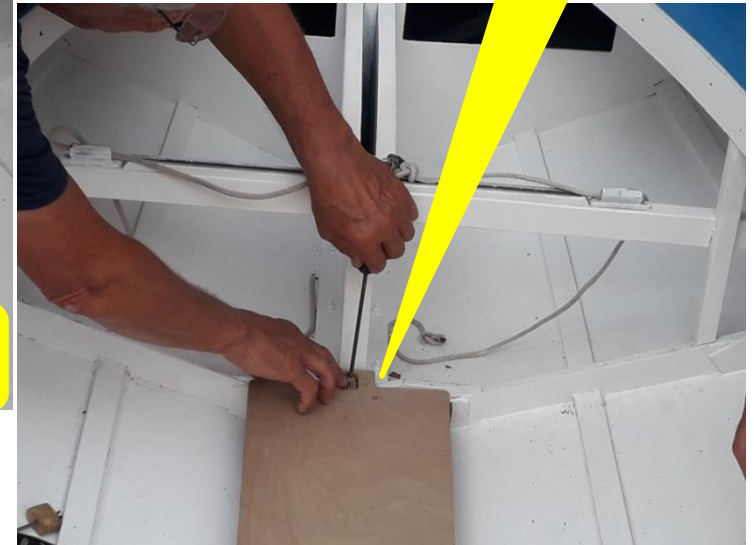



La mémoire maritime en action
La Petite Plaisance

aammlr.com

P.P.L. info

Chantier Moth Haag

Jean et Frédéric procèdent aux travaux de finition et ajustement des barrots et bordés, le puit de dérive est reposé, étape suivante; pose du cockpit et du pont en contreplaqué marine de 5mm.



Mise au niveau des bordés avec les barrots à la ponceuse



Emplacement du cockpit



Vue d'ensemble avant pose du cockpit et travaux de pontage



La mémoire maritime en action
La Petite Plaisance

aammlr.com


P.P.L. info

Chantier Caneton 57

François procède à la pose des bavettes de la dérive sous l'œil bienveillant de Jean-Paul et Christian; pose et réglage du silicone.



Dépose du silicone blanc sur toute la longueur du puit de dérive

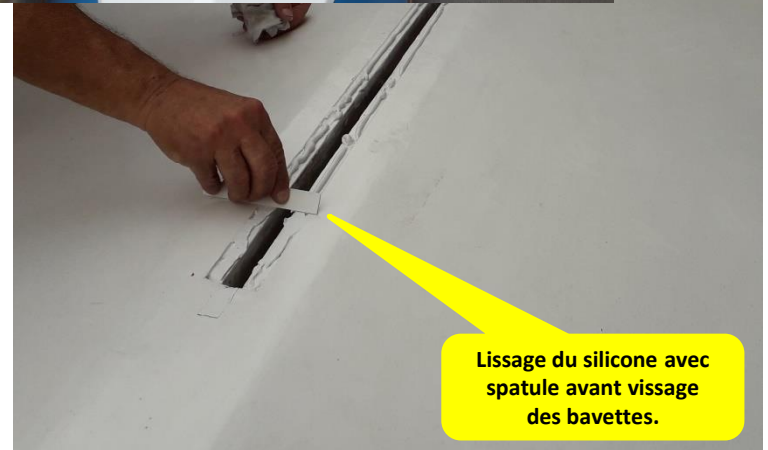

Lissage du silicone avec spatule avant vissage des bavettes.



La mémoire maritime en action

La Petite Plaisance

aammlr.com

P.P.L. info

Chantier Simplet;

« Faire et défaire c'est travailler »; le premier coulage de résine étant mal dosé, Bernard et François ont été obligés de décaper la première couche et de reprendre l'ensemble du process.





La mémoire maritime en action

La Petite Plaisance

aammlr.com

P.P.L. info

Chantier Star;

Grace aux bons contacts de Dominique avec la société Merling; nous avons une donation généreuse de sacs jute de café.

Ce qui permet à Gérard, Jean-Jacques et Jean-Marie une pose méticuleuse et un arrosage copieux pour enfin faire gonfler le Star.

Une seconde vie pour ces sacs venant du Vietnam, Ethiopie et Colombie;
Jamais Star n'aura navigué si loin!!





La mémoire maritime en action
La Petite Plaisance

aammr.com

P.P.L. info

Chantier Flibustier;

Repose de l'accastillage, nables de coffre et de tableau, fixations pour le safran remâto et gréement sont en cours. L'équipe prévoit une mise à l'eau;

Au mieux de nos intérêts communs!





La mémoire maritime en action
La Petite Plaisance

aammlr.com

P.P.L. info

Chantier Flibustier;

Détails du halebas et palan d'écoute de grand voile.



Halebas de bôme détails de fixation



Palan d'écoute de grand voile



La mémoire maritime en action
La Petite Plaisance

aammlr.com

P.P.L. info

Chantier Caneton Aubin


La réfection du liston babord est terminée , les reprises de peinture de pont également.

Jean-Michel enlève les rubans de masquage du liston avant ponçage de la coque, pour remise en peinture verte et vernis de finition.



Détail du scarf de liston
babord



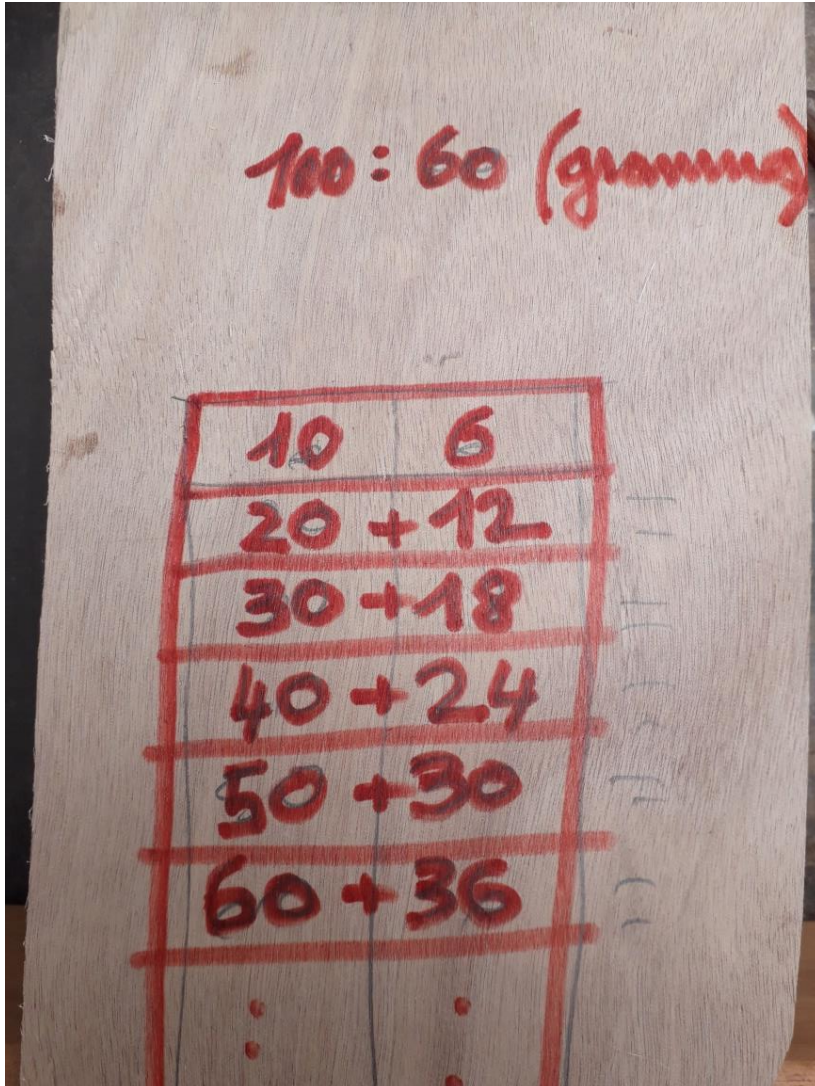

TUTO DOSAGE RESINE POLYESTER ; BASE 100 / 60

Pour éviter les petits désagréments de:

« Mauvaise qualité produit »

Vous trouverez ci-joint les tableaux de dosage en poids ,
entre résine et durcisseur; à faire sur une balance de
précision

A gauche version Action corrective immédiate réalisée par
Cédric sous contrôle de Alain Petit.

À droite version iso 14001.

TABLEAU DE DOSAGE RESINE / DURCISSEUR

édition 01.07.2019

RESINE	10 gr	DURCISSEUR	6 gr
RESINE	20 gr	DURCISSEUR	12 gr
RESINE	30 gr	DURCISSEUR	18 gr
RESINE	40 gr	DURCISSEUR	24 gr
RESINE	50 gr	DURCISSEUR	30 gr
RESINE	60 gr	DURCISSEUR	36 gr
